

BLOC 3 · RNCP 39583

SkillHunt

Coordonner et piloter un projet de développement d'applications logicielles

Plateforme de mise en relation entre freelances des métiers techniques de niche — télépilotes de drone, ingénieurs robotique, opérateurs 360° — et recruteurs.

Alix Allegre

Master 2 — Expert en développement logiciel · École Ynov · Année 2025-2026

30 min de présentation
15 min d'échanges

Deux besoins qui ne se rencontrent pas



LE CLIENT

cherche un télépilote certifié, disponible à la date du chantier et proche du site.



Mission datée



Zone d'intervention



Brevet exigé



aucun canal
ne les met en relation



LE FREELANCE

possède le matériel, les brevets et l'expérience — mais aucun canal d'acquisition.



Drone certifié



Caméra 360°



LiDAR, robotique

SkillHunt est ce canal.

Une plateforme de mise en relation pour les métiers techniques de niche, où le matériel possédé et la certification vérifiée sont des critères de recherche.

Cadre et déroulé de la présentation

Projet mené en autonomie complète. Le dispositif de conduite de projet est conçu, écrit et opéré pour l'équipe cible de trois profils.

1	Planifier Méthodologie, planning, ressources, affectation	C3.1	ÉLIMINATOIRE	7 min
2	Piloter Outil de suivi, indicateurs, tableau de bord, arbitrage	C3.2.1 · C3.2.2	ÉLIMINATOIRE	6 min
3	Manager l'équipe Missions, styles managériaux, compétences, formation	C3.3.1 · C3.3.2		6 min
4	Suivre le client Comptes rendus, points de validation, satisfaction	C3.4.1		3 min
5	Démontrer Démonstration des fonctionnalités devant le jury	C3.4.2	ÉLIMINATOIRE	5 min
RÉEL ce qui a effectivement été fait et tracé dans le dépôt Git CIBLE le dimensionnement conçu pour l'équipe d'industrialisation				

SkillHunt

La réponse



L'Armurerie : la déclaration du matériel devient une expérience gratifiante.



Des certifications vérifiées, qui se transforment en badges.



Un matching multicritères : compétences × matériel × géolocalisation.

L'architecture



Hybride : un monolithe NestJS et des microservices isolés.



Matching en FastAPI, géospatial en PostGIS.



PostgreSQL, MongoDB et Redis, le tout conteneurisé.

PÉRIMÈTRE ARBITRÉ

Lot 1 — livré et en production. Web App responsive : authentification, Armurerie, certifications, recherche géolocalisée, matching, chat temps réel. Le back-office est une API documentée, sans écran dédié.

Lot 2 — reporté, budgété, en cours de développement. Application React Native et microservice Média. Sa justification est le cas d'arbitrage que je vous présenterai.

CE QUE LE DÉPÔT CONTIENT AUJOURD'HUI

293 commits

55 Pull Requests

66 tickets Jira

274 exécutions CI

3 versions en prod.

11 semaines

01

Planifier

Organiser le cadre méthodologique, l'ordonnancement des activités, le planning et les ressources

C3.1

ÉLIM.

La méthodologie retenue

Scrum — 6 sprints de 2 semaines

POURQUOI DEUX SEMAINES assez long pour livrer un incrément testé et revu, assez court pour ré-arbitrer six fois, et compatible avec une capacité de travail limitée aux soirées.

1 Adapter le périmètre au fil des sprints
valider le matching sur de vrais usages avant de le figer

2 Cadence de démonstration régulière
validation continue, aucun effet tunnel

3 Réglementation drone mouvante
absorber une exigence sans tout replanifier

Écartées : le cycle en V, qui fige les spécifications en amont · le Kanban seul, qui n'offre aucun rendez-vous de validation.

PREUVE – JIRA, BACKLOG : SPRINT 0, SON OBJECTIF, SES DATES ET SON ESTIMATION

☐ **Sprint 0** 29 janv. – 12 févr. (7 tickets)

6180 Démarrer un sprint ...

Définir l'ensemble des spécification fonctionnelles, techniques et graphiques du projet avant le lancement des développements (Sprint 1).

SCRUM-2 Conception Fonctionnelles & UX/UI	CONCEPTION & D...	En cours	-	=	👤
SCRUM-3 Wireframes	CONCEPTION & D...	En cours	5	=	👤
SCRUM-4 Design System & Maquettes High-Fi (UI)	CONCEPTION & D...	En cours	8	=	👤
SCRUM-5 Prototype Interactif & Flux de Navigation	CONCEPTION & D...	Backlog / To Do	3	=	👤
SCRUM-6 Tâches Techniques		Backlog / To Do	-	=	👤
SCRUM-9 Architecture Logicielle & Flux (UML)	CONCEPTION & D...	En cours	5	>	👤
SCRUM-10 Spécifications API (Swagger / OpenAPI)	CONCEPTION & D...	Backlog / To Do	3	>	👤

+ Créer

7 tickets visibles sur 7 | Estimation : 24 sur 24

L'outil de planification

NIVEAU MACRO

Rétroplanning et diagramme de Gantt


Jalons, lots, dépendances, chemin critique.

NIVEAU MICRO

Backlog de tickets et sprints

Tickets estimés, rattachés à un lot, suivis par statut.

MACRO – LA CHRONOLOGIE : LES 7 LOTS DATÉS ET ORDONNANCÉS

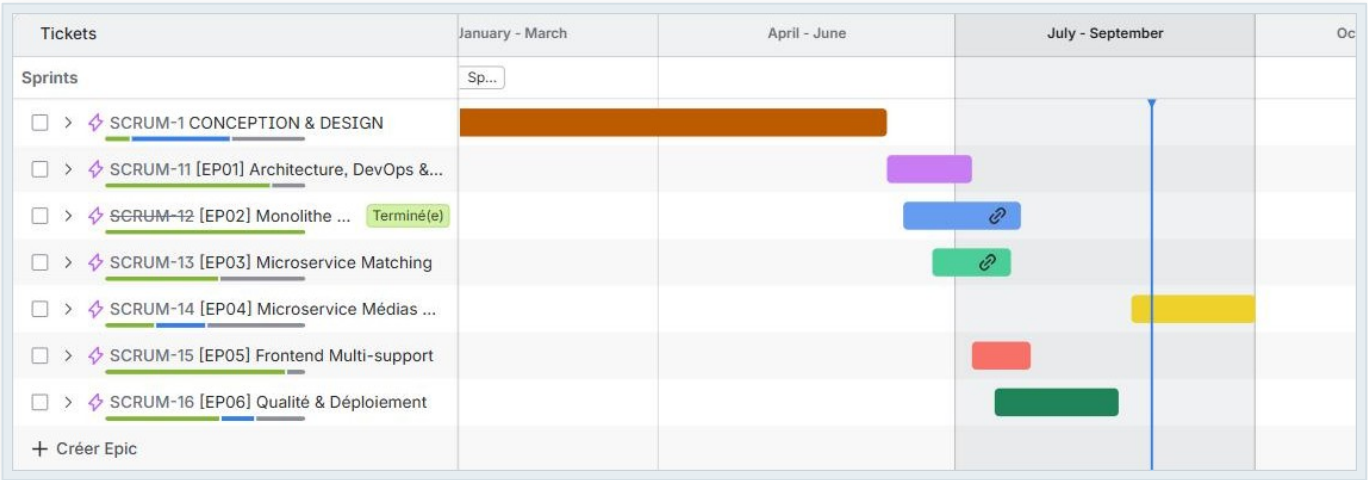

MICRO – LE BACKLOG : CHAQUE TICKET PORTE SON LOT ET SON ESTIMATION

SCRUM-7 Conception Technique & Modélisation	CONCEPTION & D...	Backlog / To Do	-	^	👤
SCRUM-20 [SH-4] Hardening : TLS 1.3, gestion des secrets, mTLS inter-services	[EP01] Architectur...	Backlog / To Do	5	^	👤
SCRUM-32 [SH-16] Pipeline de transcodage asynchrone 4K/360° (files Redis, workers auto-scalable)	[EP04] Microservi...	En cours	8	=	👤
SCRUM-33 [SH-17] Streaming & stockage : S3 + CloudFront + Signed URLs	[EP04] Microservi...	Backlog / To Do	5	^	👤
SCRUM-34 [SH-18] Portfolio interactif (exposition vidéos 4K/360°)	[EP04] Microservi...	Backlog / To Do	5	=	👤
SCRUM-41 [SH-25] App Mobile React Native + notifications Push	[EP05] Frontend M...	Backlog / To Do	13	^	👤
SCRUM-42 [SH-26] Harnais de tests d'intégration & end-to-end	[EP06] Qualité & D...	Backlog / To Do	8	=	👤

Le planning découpé en phases et en jalons



LES 5 JALONS DE VALIDATION

J1 S2

Cadrage et architecture cible (C4, niveaux 1 et 2) validés

J2 S6

Conception détaillée : modèle de données et contrats d'API

J3 S10

Moteur de matching et pipeline média

J4 S14

Beta Web fonctionnelle


J5 S16

Recette finale et mise en production V1.0

Sprint 0 de cadrage en S1–S2, puis 6 sprints de deux semaines jusqu'à S14. · C4 : modèle de documentation d'architecture à quatre niveaux — contexte, conteneurs, composants, code.

La charge estimée : 119 jours-homme


ESTIMATION PAR LOT, EN JOURS-HOMME

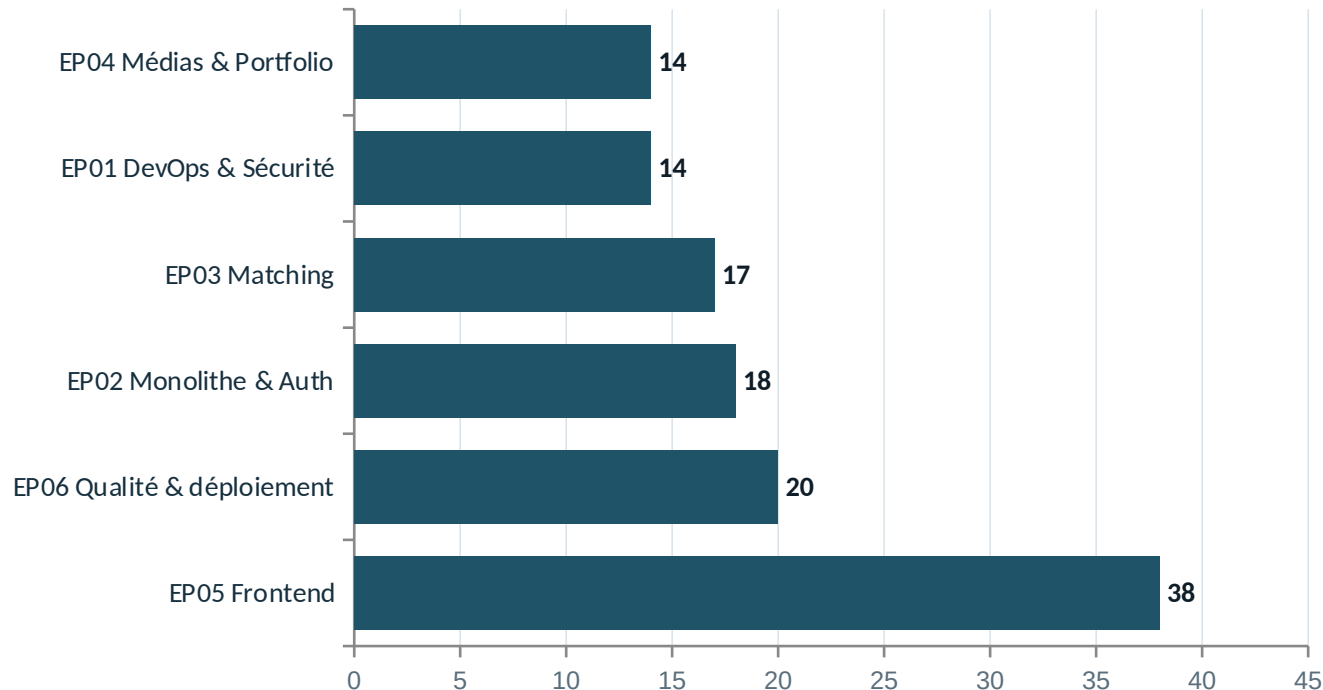

Le coefficient de risque, lot par lot

- Marge ajoutée à la charge brute, proportionnelle à l'incertitude technique du lot.
- 0 % sur EP01 · 10 % sur EP02 et EP05 · 20 % sur EP03 et EP06 · 25 % sur EP04.

JIRA — AVANCEMENT PAR LOT

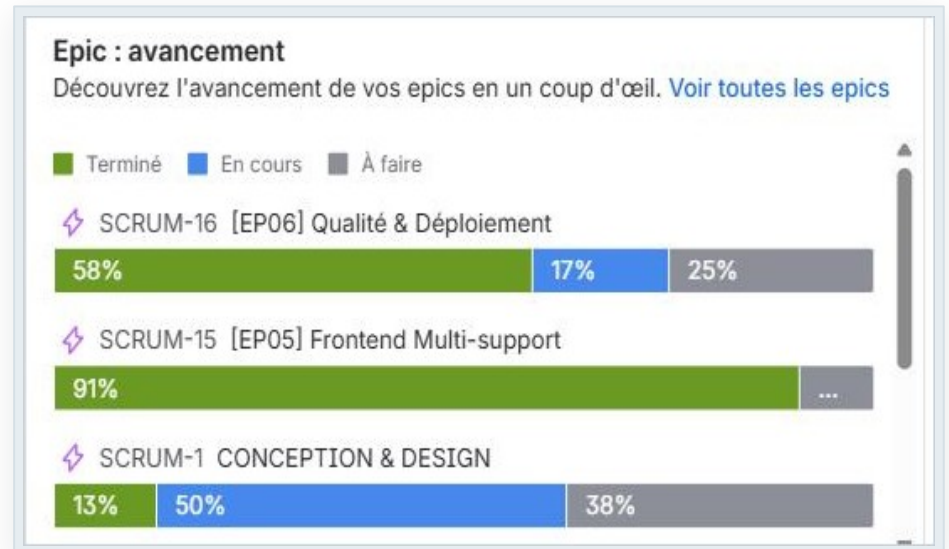

Ce que la vue Jira ajoute

- EP05 91 % · EP06 58 % · conception 13 %.
- Le découpage est mesuré en continu, lot par lot.

Les ressources nécessaires

RESSOURCES HUMAINES – ÉQUIPE CIBLE

Profil	TJM	Jours	Coût	Périmètre porté
Lead Developer / Architecte	600 €	60 j	36 000 €	Architecture, sécurité, matching, pilotage
Développeur Full-Stack	400 €	80 j	32 000 €	Monolithe, frontend web, tests
UX/UI Designer	450 €	20 j	9 000 €	Parcours, design system, Armurerie
TOTAL BUILD		160 j	77 000 €	Le rôle DevOps est porté par le Lead en Lot 1

119 jours-homme estimés, 160 jours staffés. Les 41 jours d'écart couvrent la coordination, la recette et la reprise de dette — qui ne produisent pas de fonctionnalité mais sont indispensables. Un plan qui staffe exactement la charge de production est un plan qui dérape.

Ressources matérielles et techniques

- Dev, staging et production isolés, conteneurisés.
- VM OVHcloud, registre d'images, chaîne d'intégration.
- Stockage S3 et CDN pour les portfolios.

RESSOURCES FINANCIÈRES

88 400 €

HT sur la première année

77 000 € de développement · 11 400 € d'exploitation cloud, estimés sur une base de 1 000 utilisateurs actifs

Affectation des missions et accessibilité

CIBLE

MATRICE RACI DE L'ÉQUIPE PROJETÉE

Chantier	Lead / CdP	Dev	Designer	Client
Définition des besoins	R	C	C	A
Choix d'architecture	R	A	I	I
Développement logiciel	A	R	C	I
Conformité RGPD et réglementaire	R	C	I	A
Accessibilité RGAA	A	C	R	I
Recette et validation	C	I	I	R

R Responsable · A Accountable · C Consulted · I Informed

L'accessibilité par la règle, pas par l'exception

- Tout ce qui est décidé est écrit.
- Le poste reste tenable sans l'information orale.
- J'ajoute : visio sous-titrée, chantiers documentaires.

RÉEL

JIRA — UN TICKET AFFECTÉ ET ESTIMÉ

Espaces / SkillHunt / SCRUM-16 / SCRUM-46

[SH-30] Mise en production V1.0 + PCA (rollback < 5 min)

+ ...

Description · Modifications non enregistrées

Type : Feature · Priorité : High · Estimation : 5 SP

Compétences RNCP : C2.2.2 · Lot : Lot 1 (Web MVP) · Epic : EP06 · Statut backlog : Backlog

0. Definition of Ready (DoR)

- [] Valeur claire : livrer la V1.0 en production de façon fiable et réversible.
- [] Specs complètes : déploiement, PCA, rollback < 5 min, runbook.
- [] Faisabilité : Docker (SH-2), CI/CD (SH-3), monitoring (SH-29).
- [] Estimé : 5 SP.

1. User Story

En tant que responsable de la mise en production,

Je veux un déploiement V1.0 avec plan de continuité,

Afin de livrer sereinement et pouvoir revenir en arrière rapidement.

2. Contexte & Valeur

- Pourquoi maintenant ? Aboutissement du MVP (Jalon J5).
- KPI : temps de rollback (< 5 min), taux de réussite des déploiements.

3. Critères d'Acceptation (Gherkin)

Terminé(e) ✓ Terminé ⚡

Détails

Personne assignée

Alix Allegre

Priorité

High

Parent

SCRUM-16 [EP06] Qualité & Déploiement

Date d'échéance

23 juil. 2026

Étiquettes

EP06 SH-30 déploiement lot-1

Team

Aucun

Date de début

Aucun

- Assignment, 5 Story Points, échéance, lot.
- DoR et critères d'acceptation écrits avant le code.
- Compétence RNCP citée · clés SCRUM-46 / SH-30.

Les points de vigilance et leurs parades

10 risques identifiés, cotés Probabilité × Impact. Quatre atteignent la criticité 12 et ont déclenché une action prioritaire.

CRITICITÉ	PARADE MISE EN ŒUVRE	INDICATEUR DE CONTRÔLE
R2 16 Usurpation de compétences et fausses certifications	Vérification des métadonnées PDF, workflow de validation admin, badge « Vérifié ».	Délai moyen de validation des brevets DGAC
R1 12 Saturation du transcodage vidéo	Traitement asynchrone en file d'attente, autoscaling des workers.	Taille de la file d'attente (alerte au-delà de 50)
R7 12 Injections SQL, NoSQL et commandes système	Bannissement des requêtes brutes, validation stricte des entrées par DTO.	Volume de requêtes bloquées par la gateway
R10 12 Faible taux de complétion des profils	Gamification de l'Armurerie : cartes visuelles, progression, badges.	Taux d'abandon du tunnel d'inscription

02

Piloter

Outils de suivi, indicateurs clés, analyse des écarts et arbitrages

C3.2.1

ÉLIM.

C3.2.2

L'outil de suivi



Toute exigence qui va jusqu'en production a franchi ces quatre maillons, dans cet ordre. Chacun laisse une trace horodatée, et aucun ne peut être sauté.

LES PULL REQUESTS55

55 Total

AuthorLabelProjectsMilestonesReviewsAssigneeSort

feat(SH-15): scaffolding du media-service (Node + FFmpeg) — EP04

#80 by alixanta · Owner · was merged 4 days ago

fix(SH-50): cAdvisor — investigation des sondes S4/S5 sans données (NON RÉSOLU)

#77 by alixanta · Owner · was merged last week

release: v1.1.0 — supervision et alerting en production

#76 by alixanta · Owner · was merged 2 weeks ago · 11 of 11 tasks

docs(release): fige le CHANGELOG sous v1.1.0

#75 by alixanta · Owner · was merged 2 weeks ago

docs(SH-49): clôt AN-01 — vérifiée en production

#73 by alixanta · Owner · was merged 2 weeks ago

release: v1.0.1 — correctif AN-01 et hygiène des dépendances

#50 by alixanta · Owner · was merged 2 weeks ago · 9 of 11 tasks

docs(release): fige le CHANGELOG sous v1.0.1

#49 by alixanta · Owner · was merged 2 weeks ago

Chaque branche porte le numéro de son ticket : feature/SH-15, fix/SH-50.

L'INTÉGRATION CONTINUE274

Actions

All workflows

Dependabot Updates

SkillHunt - CI Docker

SkillHunt - CI FastAPI Matching Service

SkillHunt - CI Frontend Web

SkillHunt - CI Media Service

SkillHunt - CI NextJS API

SkillHunt - Publication images staging SH-30

Management

Caches

All workflows

Showing runs from all workflows

274 workflow runs

WorkflowEventStatusBranchActor

Merge pull request #80 from alixanta/feature/SH-15-scaffolding...

SkillHunt - CI Docker #51: Current [SH-15](#) pushed by [alixanta](#)

develop

Aug 26, 19:21 GMT+2

40s

Merge pull request #80 from alixanta/feature/SH-15-scaffolding...

SkillHunt - CI Media Service #5: Current [SH-15](#) pushed by [alixanta](#)

develop

Aug 26, 19:21 GMT+2

40s

ci(deps): bump actions/setup-node from 4 to 7

SkillHunt - CI NextJS API #8: Pull request #50 synchronised by [dependabot](#)

dependabot/github_actions/...

Aug 26, 19:18 GMT+2

1m 54s

ci(deps): bump actions/setup-node from 4 to 7

SkillHunt - CI Media Service #4: Pull request #50 synchronised by [dependabot](#)

dependabot/github_actions/...

Aug 26, 19:18 GMT+2

1m 26s

ci(deps): bump actions/setup-node from 4 to 7

SkillHunt - CI Frontend Web #66: Pull request #50 synchronised by [dependabot](#)

dependabot/github_actions/...

Aug 26, 19:18 GMT+2

1m 25s

ci(deps): bump actions/checkout from 4 to 7

SkillHunt - CI NextJS API #48: Pull request #50 synchronised by [dependabot](#)

dependabot/github_actions/...

Aug 26, 19:12 GMT+2

1m 20s

6 pipelines. Lint, tests, audit de sécurité et build tournent à chaque poussée ; un échec interdit la fusion.

LE JOURNAL DES VERSIONS3

Table de correspondance des déploiements

Version	Déployée le	Tag Git	Commit publié	Image GHCR	Environnement
1.0.0	2026-07-23	v1.0.0	5045682 (PR #42, develop → main)	ghcr.io/alixanta/skillhunt/(backend-core,matching-service,frontend-web,gateway):a94568ab5e564cc64ad71b43cfa92e776802b60 (+ :latest)	Production — VM OVHcloud 147.135.230.140
1.0.1	2026-08-18	v1.0.1	bfadcff (PR #50, develop → main)	ghcr.io/alixanta/skillhunt/(backend-core,matching-service,frontend-web,gateway):bfadcff21f8355a42958f6c6e643420af6c0543dc (+ :latest)	Production — VM OVHcloud 147.135.230.140

Version, tag, commit, image, environnement — la table qui rend le retour arrière possible en moins de cinq minutes.

Pourquoi cet outillage épouse Scrum. Le ticket porte le contrat fonctionnel, écrit avant le code. La branche porte l'unité de travail du sprint. La Pull Request porte le point de contrôle qualité. La version porte la livraison.

Des indicateurs mesurables et quantifiables

Chaque axe porte un seuil exigé et une valeur constatée. Et ces seuils ne sont pas déclaratifs : ils sont bloquants en intégration — un seuil non atteint rend la fusion techniquement impossible.

Axe	Indicateur	Seuil exigé	Mesuré sur le projet	Contrôle
Avancement	Tickets terminés sur tickets ouverts par lot	—	39 terminés sur 66 · EP02 et EP05 clos	Continu
Délais	Écart au jalon, en jours	0	Mise en production tenue au 23/07/2026	Par jalon
Coûts	Jours-homme consommés sur estimés	≤ 110 %	SH-14 : 5 points estimés, 8 à 13 réels	Par sprint
Qualité	Couverture des tests unitaires	≥ 80 %	87 % sur le monolithe	Chaque commit
Qualité	Vulnérabilités de dépendances	0 critique	9 vulnérabilités résorbées (SH-47)	Chaque commit
Qualité	Score d'accessibilité	≥ 90 / 100	100 / 100 sur les pages publiques	Chaque build
Performance	Temps de réponse de l'API, p95	< 200 ms	Vérifié sur 1 000 profils	Staging et prod.
Exploitation	Délai de détection d'un incident	< 4 min	3 min 04 s mesurées	Production

Le tableau de bord

1 Avancement CHAQUE LOT × CHAQUE STATUT
EP02 et EP05 clos ; EP04 en retrait, c'est le lot reporté.
39 tickets terminés sur 66.

Statistiques de filtre bidimensionnel : SkillH...

Parent	BACKLOG / TO DO	EN COURS	TERMINÉ(E)
Aucun parent	1	6	1
CONCEPTION & DESIGN	3	4	1
[EP01] Architecture, DevOps & Sécurité	1	0	5
[EP02] Monolithe & Authentification	0	0	10
[EP03] Microservice Matching	3	0	4
[EP04] Microservice Médias & Portfolio	2	1	1
[EP05] Frontend Multi-support	1	0	10
[EP06] Qualité & Déploiement	3	2	7
Total des tickets uniques:	14	13	39

Regrouper par: État


Affichage de 8 statistiques :

Dernière actualisation : à l'instant

2 Délais
5 jalons J1→J5 · mise en production tenue au 23/07/2026 · 3 versions déployées, une quatrième en cours de développement.
Écart au jalon contractuel : 0 jour.

3 Coûts
119 J/H estimés · 77 000 € HT de développement · exploitation cloud 950 €/mois pour 1 000 utilisateurs actifs.
Dérive suivie : SH-14, estimé 5 points, réalisé 8 à 13.

4 Risques
10 risques cotés Probabilité × Impact, chacun avec son indicateur de contrôle chiffré.
4 en criticité ≥ 12 · R2, fausses certifications, reste le plus critique à 16.



Le cas d'arbitrage

LA PROBLÉMATIQUE

À sept jours de la mise en production, le périmètre restant au backlog excède la capacité disponible. Le tableau de bord le montre : 138 commits sur la semaine, sur un temps de travail limité aux soirées. Il reste le microservice Média (14 J/H), l'application mobile, le chat temps réel, la cartographie et la double authentification.

LES CONSÉQUENCES SI RIEN N'EST ARBITRÉ

Délai

La date de livraison est contractuelle et non négociable : elle ne peut pas absorber le dépassement.

Qualité

Livrer tout le périmètre suppose de sacrifier les tests, la sécurité et l'accessibilité — c'est-à-dire la valeur même du livrable.


Dette

Du code non testé mis en production devient une dette non tracée, donc invisible au pilotage.

Le triangle de fer : périmètre, délai, qualité. Deux des trois sommets sont bloqués — l'arbitrage ne peut donc porter que sur le périmètre.

Les options, la décision et son résultat

LOGIGRAMME DE DÉCISION

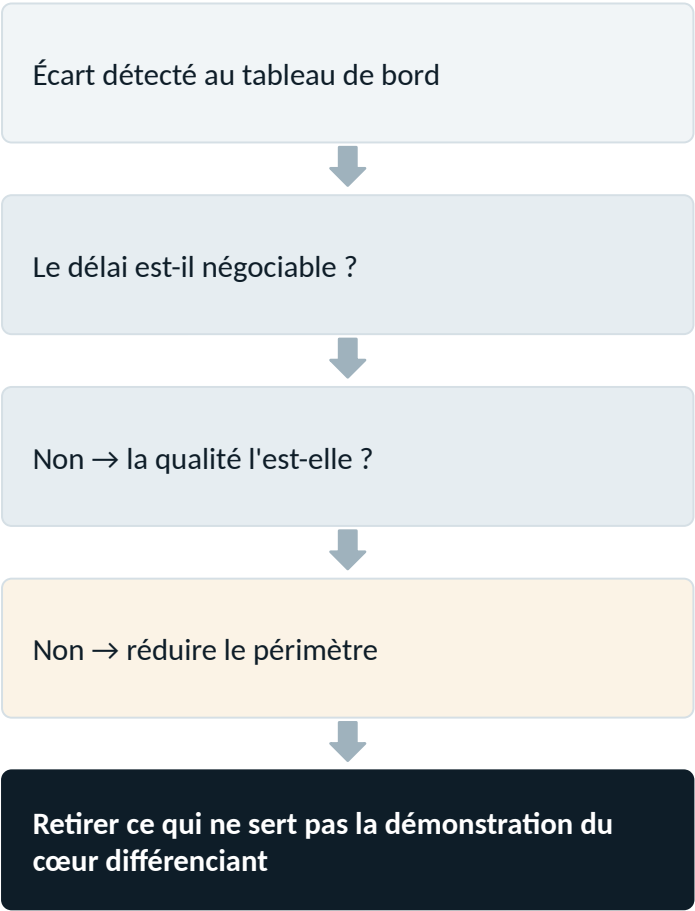

LES OPTIONS ÉVALUÉES

A Tout livrer, en dégradant la qualité

Écartée

Délai tenu, mais les preuves de test, de sécurité et d'accessibilité s'effondrent.

B Décaler la mise en production

Écartée

Impossible : la date de livraison est contractuelle.

C Resserrer le périmètre sur la boucle métier de bout en bout

Retenue

Le microservice Média (14 J/H) et l'application mobile passent en Lot 2, budgétés et conservés au backlog.

LE RÉSULTAT MESURÉ

23/07

Mise en production tenue, version 1.0.0

La marge dégagée par l'arbitrage a permis de livrer en plus, avant la date, trois fonctionnalités initialement dé-priorisées :

- SH-40 double authentification
- SH-23 cartographie des résultats
- SH-24 chat temps réel

03

Manager l'équipe

Affectation des missions, styles managériaux, évaluation et développement des compétences

C3.3.1

C3.3.2

Quatre styles managériaux selon la phase



1

Directif

Cadrage : conformité RGPD, exigences réglementaires drone, sécurité applicative.



2

Persuasif

Choix d'architecture et adoption de la méthode de travail.



3

Participatif

Affinage du backlog, conception du matching, rétrospectives.



4

Délégatif

Réalisation des sprints par les profils autonomes sur leur domaine.

Le style n'est pas un trait de caractère, c'est un choix contextuel.

Handicap : le délégatif ne tient que parce que tout est écrit. L'aménagement du poste se décide en participatif, avec la personne.

Analyse critique : le pilotage au vert

L'ERREUR DE POSTURE

J'ai adopté une posture délégative envers mon propre outillage. Tous mes indicateurs étaient verts — 87 % de couverture, zéro erreur de lint, zéro vulnérabilité critique — et j'en ai conclu que le produit allait bien. J'ai confondu « les indicateurs sont verts » et « le logiciel fonctionne ».

TROIS CONSÉQUENCES MESURÉES

2

bugs bloquants du parcours d'authentification ont échappé à 103 tests verts : le serveur ne démarrait pas, et l'utilisateur était déconnecté à chaque rafraîchissement.

26

jours d'exposition en production d'une anomalie de sonde (AN-01), découverte fortuitement — aucune sonde ne couvrait les conteneurs concernés.

9

défauts trouvés uniquement en exécutant la chaîne complète en conditions réelles, invisibles pour 68 tests d'instrumentation restés verts.

La correction apportée

- Tests de démarrage : vérifier que l'application se lance.
- Aucune anomalie close sans vérification en conditions réelles.

La recommandation, chiffrée

- Une pré-production strictement identique à la production.
- Motif : 4 divergences dev/prod sur un seul ticket.
- Coût : 1 journée de mise en place, ~30 € par mois.

Les outils de communication et leurs objectifs

CHAQUE OUTIL RÉPOND À UN OBJECTIF, ET UN SEUL

Outil	Objectif poursuivi	Rythme
Ticket SH-xx (DoR, Gherkin, DoD)	Contrat de travail partagé : ce qui est attendu est écrit avant le code	Par feature
Index de backlog à statuts	Vision d'ensemble de l'avancement, accessible sans réunion	Continu
Revue de Pull Request	Qualité du code et diffusion de la connaissance technique	55 revues
Documents de conception datés	Tracer les décisions d'architecture et leurs alternatives écartées	11 documents
Journal des versions	Dire au commanditaire ce qui tourne réellement en production	Par déploiement
Runbook d'exploitation	Une section par alerte, écrite pour être lue pendant l'incident	Continu
Alerting par courriel	Signalement des incidents, sujet préfixé par la sévérité	22 notifications

Le partage de ressources. Tout est versionné au même endroit que le code : le contexte se transmet sans réunion.

Évaluation des besoins en compétences

Niveau actuel / niveau requis, de 0 (novice) à 4 (expert). Le niveau requis est celui qui permet de tenir le rôle sans filet : 4 quand la personne est le dernier recours sur cet axe, 3 quand son travail passe en revue, 2 quand il suffit de comprendre pour collaborer.

Compétence à mobiliser	Lead / CdP	Développeur	Designer	Écart
Architecture hybride et conteneurisation	3 / 4	2 / 3	—	Modéré
Développement NestJS / TypeScript	4 / 4	3 / 3	—	Aucun
Algorithmie de scoring, Python / FastAPI	3 / 4	1 / 2	—	Modéré
Géospatial PostGIS	2 / 3	1 / 2	—	Fragilité unique
Sécurité applicative, OWASP et RGPD	3 / 4	2 / 3	—	Modéré
Accessibilité RGAA 4.1	2 / 3	2 / 3	2 / 4	Critique
Observabilité et supervision	1 / 4	1 / 3	—	Critique
UX et gamification	2 / 3	—	4 / 4	Aucun

L'écart le plus coûteux

- 1. **Observabilité — acquis nul.**
27 jours en production sans supervision.
- 2. **Géospatial PostGIS.**
Un seul porteur : fragilité unique.
- 3. **Accessibilité RGAA.**
Niveau 2 pour un requis 3, seuil bloquant.

Le plan de développement des compétences

Écart traité	Action de montée en compétence	Modalité	Échéance	État
Observabilité	Instrumentation Prometheus, Loki et Grafana, puis rédaction du runbook d'exploitation	Auto-formation encadrée par un livrable documentaire	Avant mise en production	Réalisé
Géospatial PostGIS	Programmation en binôme sur le module de recherche, puis rotation sur le scoring	Binômage, pour supprimer le point de fragilité unique	Sprints 3 et 4	Planifié
Accessibilité RGAA	Formation au référentiel RGAA 4.1, doublée d'un audit automatisé bloquant en intégration	Formation en ligne gratuite, ressources publiques	Avant le jalon J4	Réalisé
Sécurité et dépendances	Politique de mise à jour formalisée, veille outillée sur quatre écosystèmes	Procédure écrite et automatisation	Continu	Réalisé
Renfort à recruter	Profil DevOps à temps plein pour la phase de passage à l'échelle	Fiche de poste transmise au service RH	Lot 2	Transmis

MODALITÉS ADAPTÉES AUX SITUATIONS DE HANDICAP

La même logique qu'à la slide 11 :
chaque montée en compétence a produit un support écrit — une formation qui laisse une trace est suivable sans l'oral.
Pour l'équipe cible : asynchrone, temps majoré, poste aménagé, sous-titres.

04

Suivre le client

Comptes rendus, points de validation et indicateurs de satisfaction

C3.4.1

Comptes rendus et points de validation

Le gabarit de compte rendu

Format constant, cinq blocs, une page :

1 Réalisé sur la période

2 En cours

3 Points bloqués

4 Décisions attendues du client

5 Risques et alertes

LES POINTS DE VALIDATION PLANIFIÉS

Par ticket	Definition of Done vérifiée avant fusion
Par Pull Request	55 revues, intégration continue bloquante
Par jalon	5 jalons contractuels, de J1 à J5
En recette	18 scénarios : fonctionnels, structurels, de sécurité

Les indicateurs de satisfaction

MESURÉS SUR LE PROJET

16 / 18

scénarios de recette validés dès la première exécution

les 2 autres ont été corrigés, puis re-testés avec succès

0

anomalie bloquante encore ouverte le jour de la livraison

AN-01 et AN-02 corrigées et vérifiées avant la remise

< 24 h

entre le signalement d'une anomalie par un utilisateur et sa correction vérifiée

AN-02 : création de compte refusée, diagnostiquée et corrigée le jour même

LA LIMITE QUE J'ASSUME

Aucun retour utilisateur structuré n'a été collecté sur la démonstration publique. Mes indicateurs mesurent la conformité du produit, pas la satisfaction de ceux qui l'utilisent. C'est une limite réelle, et je préfère la nommer plutôt que de la combler par un exemple reconstitué.

LE DISPOSITIF PROPOSÉ, COHÉRENT AVEC UNE PLACE DE MARCHÉ À DEUX VERSANTS

Côté recruteur

Pertinence perçue des profils proposés, notée de 1 à 5 après chaque recherche

Côté freelance

Taux de complétion du tunnel d'inscription — l'indicateur du risque R10

Les deux

Entretiens avec trois utilisateurs cibles et formulaire en pied de démonstration

05

Démontrer

La dernière version du logiciel, en fonctionnement, devant le jury

C3.4.2

ÉLIM.

Le scénario de démonstration

1

Un télépilote crée son profil

Inscription, ville d'activité, puis l'Armurerie : déclaration du matériel sous forme de cartes, avec progression et badges.

2

La validation, par l'API

Le back-office est une API documentée, pas un écran bricolé : la file de validation dans Swagger, puis l'appel qui bascule l'équipement en statut vérifié.

3

Un recruteur recherche

Filtres compétence et matériel, rayon géographique. Les profils remontent classés par score de correspondance et s'affichent sur la carte.

Le cœur différenciant du produit — donnez-lui un tiers du temps.

4

La mise en relation

Consultation de l'armurerie publique du candidat, puis ouverture du chat contextuel et échange de messages en temps réel.

La phrase de clôture, obligatoire : « cette version couvre l'intégralité du périmètre du Lot 1 tel qu'il a été arbitré le 16 juillet. Je vous propose de la valider pour la mise en production. »

Ce que le dispositif a produit

23/07/2026

Mise en production tenue,
à la date arbitrée

3

versions déployées, tracées
du ticket à l'image en production

87 %

de couverture de tests,
seuil bloquant à l'intégration

3 min 04

de délai de détection
d'un incident en production

CE QUI VIENT ENSUITE — LA VERSION 2

Microservice Média

Transcodage asynchrone et portfolios
vidéo — l'epic EP04, arbitré hors du
Lot 1.

Application mobile

React Native, avec les notifications
push.

Frontend

Améliorations issues de la recette et
des retours d'usage.

Vérification des certifications

Renforcement du contrôle et du
workflow de validation.

Le Lot 2 est budgété et conservé au backlog : rien n'a été abandonné, tout a été ordonnancé.

Merci — je réponds à vos questions.
